

Innenbeschattung INTRA

Checkliste für die Montage




<u>erledigt:</u>

Sehr geehrte MHZ-Monteurin, sehr geehrter MHZ-Monteur,

diese Checkliste soll Sie in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Wenn Sie auf diese Punkte achten, tragen Sie erheblich zur Langlebigkeit des Produktes bei. Sie dient zu Ihrer eigenen Kontrolle. Bitte beachten Sie hierzu die beiliegende Montageanleitung. Bewahren Sie die ausgefüllte Checkliste bei Ihren Unterlagen auf.

Bei der Montage der Anlage:

1. Anlagenrastermaß vorne und hinten überprüfen (Differenz max. 2 mm) Diagonalmaß X + Y überprüfen (Differenz max. 5 mm)




Gemessene Maße:


Rastermaß oben:

Während der Montage:


2. Sicherungssschrauben beidseitig anbringen




3. Seilführung in Führungsschiene beachten (Seilverlauf von oben nach unten)

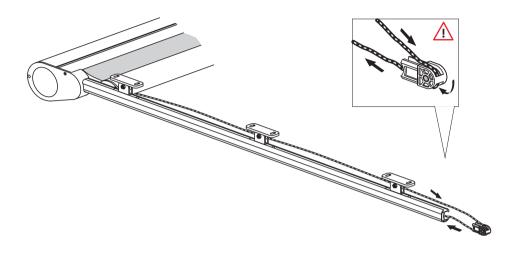


4. Seillänge und Knoten überprüfen (beidseitig 30 - 35 cm von Kante Bodenprofil, Seilende darf max. 1-2 cm nach dem Knoten überstehen, aber auch nicht weniger)





5. Seil muss auf der Umlenkrolle laufen



6.	Anlage ausfahren. Beim Aufwickeln muss die erste Lage des Seils nebeneinander liegen (ggf. von Hand nebeneinander legen)	
	1. Wicklung 2. Wicklung	
7.	Obere und untere Endlage des Motors programmieren und festsetzen (siehe Beiblatt Einstellanleitung für Einsteckantriebe)	
8.	Auf Kabelführung achten (darf nicht an Seilscheibe streifen)	

Nach der Montage:

10.	Probelauf	der Anlage	durchführen,	Endlagen	und T	Tuchverla	auf übe	rprüfen
	(Motor mus	s bei Erreiche	n der Endlagen a	abschalten)				

Wind- und Sonnenwächter ☐ ja ☐ nein
Windfühler wurde auf folgenden Wert eingestellt:

11. Funktionsprüfung WISO (Zubehör)

9. Alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz überprüfen

Kommission:	Auftragsnummer:	
Montageort / Adresse:	Firmenname / Ort:	
Datum:	Unterschrift:	
